

Настоящий отчет представлен по результатам регрессионного тестирования по проекту создания лендинга к мероприятию **GeekChange**.

Для проверки работоспособности функционала был составлен Чек-лист, содержащий 50 проверок.

Команда тестировщиков состоит из 5 человек.

Период тестирования: 05.10.23 - 07.10.23


Запланированное распределение нагрузки:

Всего тестов	50	Дата	05.10.23	06.10.23	07.10.23
Дней на тестирование	3	План (сколько пройти)	17	17	16

Отчет по результатам на конец дня **06.10.23**:

Дата	План (сколько осталось пройти)	Факт (осталось пройти)
старт	50	50
05.10.23	33	39
06.10.23	16	37
07.10.23	0	


Диаграмма Burndown

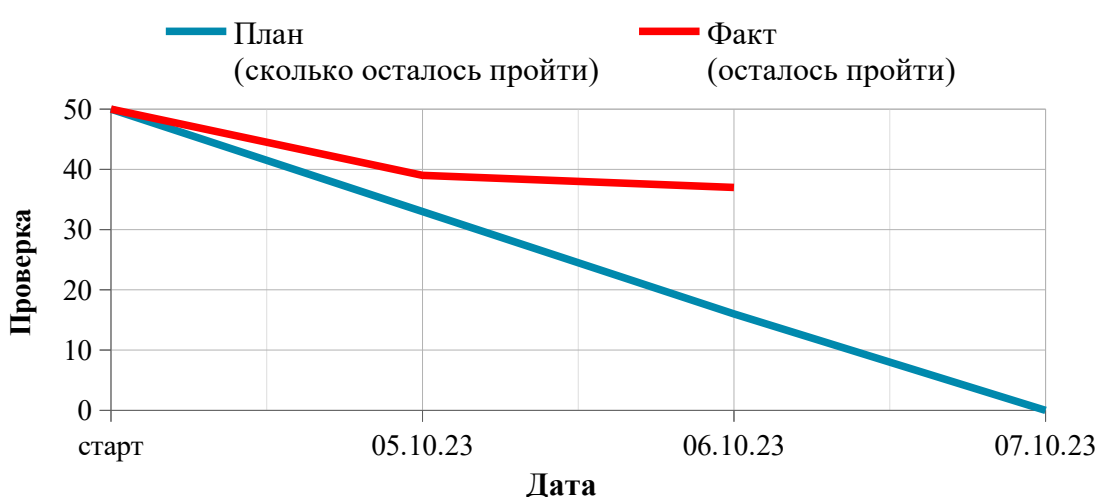


Текущий статус по тестам:

Статус	passed	failed	blocked	unexecuted
Итого	13	25	0	12

Статус по тестам

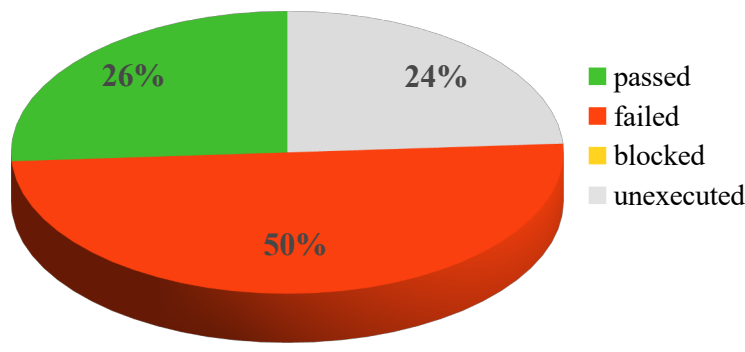


Общий статус по тест-кейсам

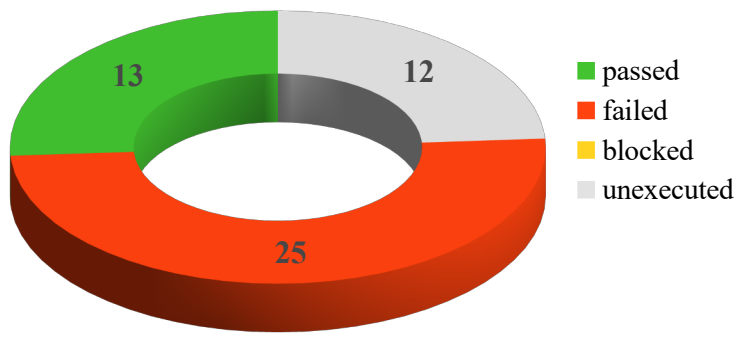


Текущий статус по тестировщикам:

Тестировщик	passed	failed	blocked	unexecuted
Артём Александров	2	5	0	4
Ирина Павлова	2	5	0	2
Мария Иванова	2	4	0	1
Михаил Котов	2	6	0	3
Ольга Петрова	5	5	0	2
Итого	13	25	0	12

Статус по прохождению тестов

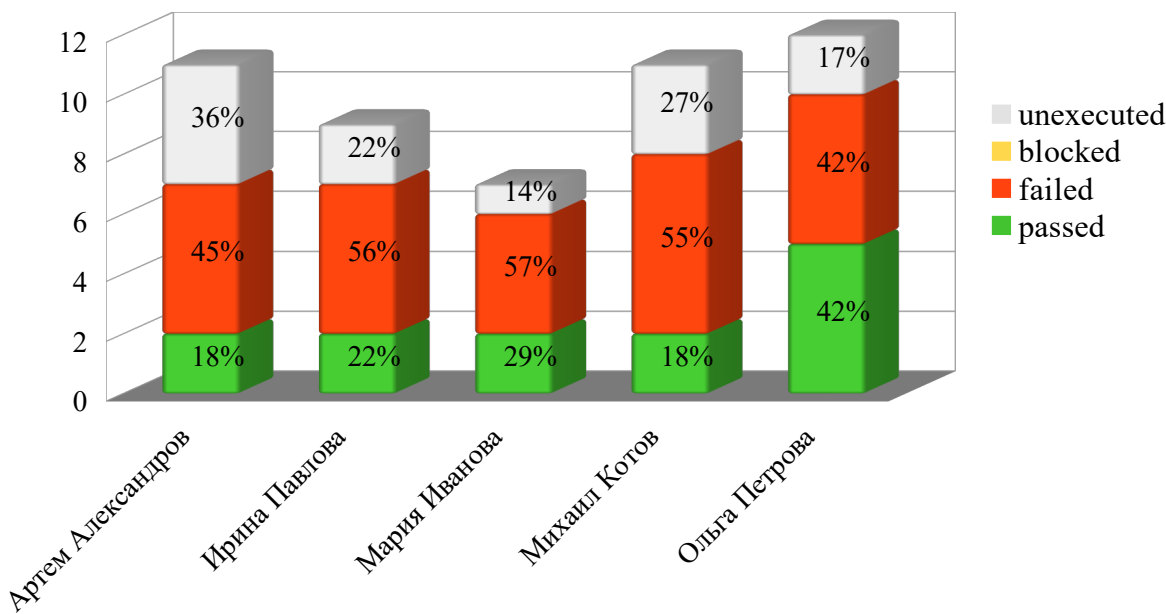

Статус тест-кейсов по тестировщикам

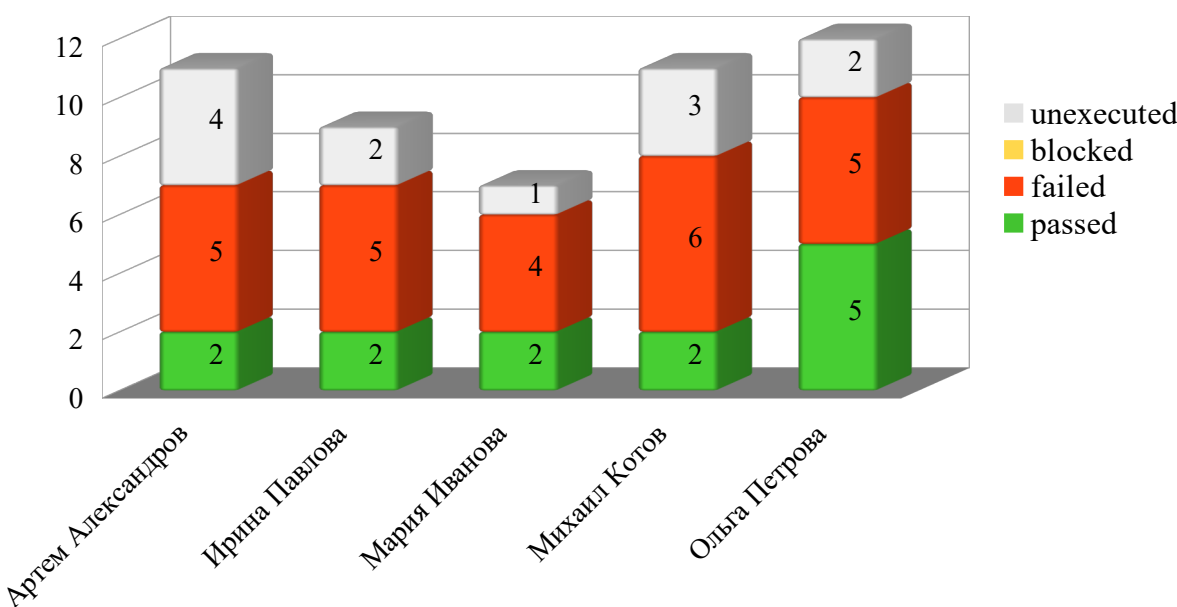


Статистика по багам

Дата	Открыто багов	Закрыто багов	Осталось открыто	Зарыто всего
05.10.23	15	2	13	2
06.10.23	10	6	17	8


Критичность	Количество
critical	3
high	6
medium	13
low	3

Статус	Количество
open	7
in progress	10
closed	8


Статистика по багам

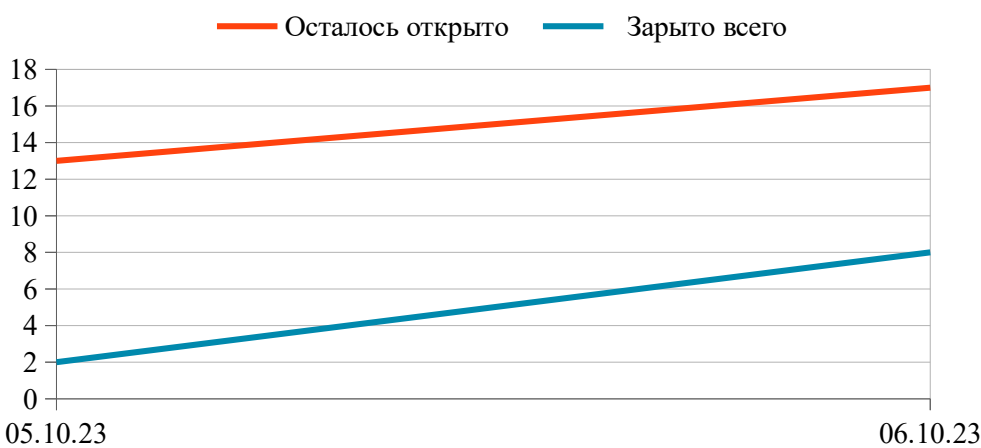

Баги по критичности

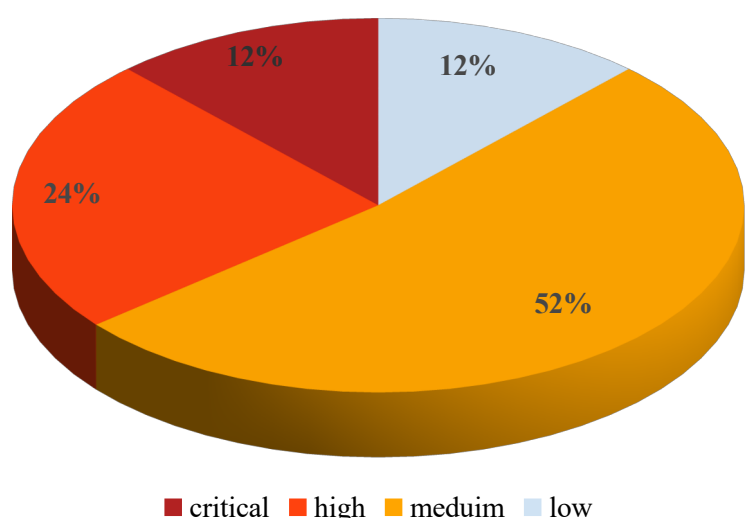

Баги по статусу

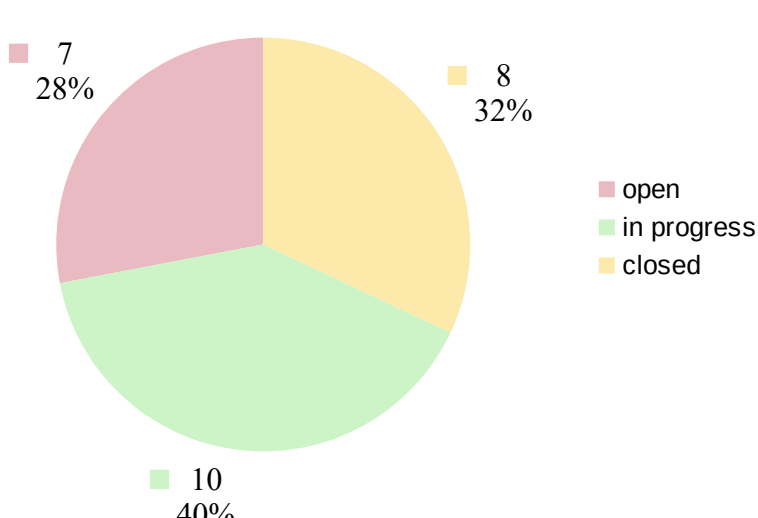

Итоги:

на конец дня 05.10.2023	на конец дня 06.10.2023	отставание от плана
успешно пройдено	11 тестов	успешно пройдено 2 теста на 05.10.2023 6 тестов
открыто дефектов	15	открыто дефектов 10 на 06.10.2023 15 тестов
закрыто дефектов	2	закрыто дефектов 6 Итого: 21 тест
на 07.10.2023		
запланировано		осталось по факту
16 тестов		37 тестов

Статистический анализ показывает, что 36% открытых багов имеют высокую степень критичности. На исправление данного функционала потребуются дополнительные затраты по времени.

Вывод: в сложившейся ситуации нет возможности уложиться в запланированные сроки тестирования.

Предложения: необходимо привлечь дополнительные ресурсы к данному проекту и (или) увеличить сроки проведения регрессионного тестирования.
